

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2025 को कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक-20.05.2025 को आयोजित बैठक में ब्रेडा, पटना एवं पंचायती राज विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए :-

- (i) सचिव, पंचायती राज विभाग
- (ii) निदेशक, ब्रेडा, पटना।
- (iii) निदेशक, पंचायती राज विभाग।
- (iv) संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग।

मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के संबंध में ब्रेडा द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। तृतीय चरण के कार्यों के संबंध में ब्रेडा द्वारा बताया गया कि 2,69,337 निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध विभिन्न एजेंसियों द्वारा 1,98,574 ल्यूमिनरी, 1,94,931 लिथियम बैटरी एवं 1,62,766 पी.वी. मॉड्यूल का NABL एक्क्रेडिटेड लैब से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर डिस्पैच इंस्ट्रक्शन (DI) निर्गत किया गया है।

तृतीय चरण में निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध अबतक 28,677 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया गया है एवं M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd., M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd. द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। तृतीय चरण में डिस्पैच इंस्ट्रक्शन (DI) के संबंध में एजेंसीवार निम्न स्थिति पाई गयी:-

Sl. No.	Name of Agency	Work Order	DI			Installation	Installation Remaining
			Luminaire	Battery	PV Module		
1	M/s Lord's Mark Industries Pvt. Ltd.	19999	17910	18709	15349	351	19648
2	M/s ITI Ltd.	12086	15906	15906	4008	956	11130
3	M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd.	17510	0	0	0	0	17510
4	M/s Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd.	14270	14270	14270	14270	2100	12170
5	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd.	13081	8560	5100	7310	3270	9811

Sl. No.	Name of Agency	Work Order	DI			Installation	Installation Remaining
			Luminaire	Battery	PV Module		
6	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd.	17278	17278	17278	8200	898	16380
7	M/s Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd.	17085	9250	9400	6250	989	16096
8	M/s Ganesh Green Bharat Ltd.	20417	14110	14110	10600	4446	15971
9	M/s Amit Pomeg - Tech India Pvt. Ltd.	15178	15178	15178	15178	2850	12328
10	M/s KLK Ventures Pvt. Ltd.	21860	14500	14500	15000	1199	20661
11	M/s Syska LED Lights Pvt. Ltd.	25110	10500	10500	10500	1122	23988
12	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd.	9248	4466	4466	4466	0	9248
13	M/s Sugs Lloyd Ltd.	14240	14240	14240	14240	3282	10958
14	M/s EESL	16920	8720	8720	2000	0	16920
15	M/s Bondada Engg. Ltd.	17068	17064	17064	17064	3650	13418
16	M/s Agrowin Agri Solutions Pvt. Ltd.	8432	8352	7220	8352	2978	5454
17	M/s Suryam International Pvt. Ltd.	15339	8270	8270	9979	586	14753
GRAND TOTAL		275121	198574	194931	162766	28677	246444

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अभी भी ITI, Visual Technology, Rajarshi, Ganesh Green, KLK venture, Syska, Landsky, EESL और Suryam के द्वारा पी.वी. मॉड्यूल का D.I. निर्गत कार्यादेश के तुलना में काफी कम है एवं जिन एजेंसियों के द्वारा Type-A सामग्रियों का D.I. निर्गत किया जा चुका है, उनके द्वारा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की प्रगति काफी धीमी है।

सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि एजेंसियों से किए गए एकरारनामा की शर्त के अनुसार Type-A सामग्रियों का D.I. निर्गत होने के 21 दिनों के अंदर सामग्री जिला स्थित गोदाम में पहुंचा दिया जाना है। साथ ही DPRO एवं ब्रेडा के अभियंता द्वारा सामग्रियों के संयुक्त जाँच के 7 दिनों के अंदर सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया जाना है एवं 3 दिनों के अंदर CMS/RMS पर कार्यरत सोलर स्ट्रीट लाईट प्रदर्शित होना निर्धारित है। यदि

Day

निर्धारित समय-सीमा के अंदर एजेंसी द्वारा SSL का अधिष्ठापन नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में प्रति सप्ताह विलम्ब के लिए प्रति सोलर लाईट के मूल्य का 5% राशि पेनाल्टी के रूप में काटी जाएगी। पेनाल्टी की राशि 20% अथवा चार सप्ताह की अवधि के लिए काटी जाएगी। जिसके पश्चात एजेंसी को निर्गत कार्यादेश निरस्त करने का प्रावधान है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिया गया:—

(क) एकरारनामा/EOI के निहित शर्तों में दिए गए टाइम लाईन के अनुसार जिन एजेंसियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

(ख) विभाग एवं ब्रेडा द्वारा समीक्षा किया जाए कि तृतीय चरण के लिए चयनित एजेंसी द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत PDI के लिए कब Call raise किया गया। ब्रेडा द्वारा एजेंसी के PDI हेतु Call raise करने के उपरांत किस एजेंसी को किस तिथि तक पूर्ण सामग्रियों का D.I. निर्गत किया जा चुका है। एजेंसियों एवं ब्रेडा द्वारा D.I. निर्गत किये जाने हेतु टाइमलाईन का पालन किया जा रहा है, अथवा नहीं इसकी समीक्षा की जाए एवं तदनुसार विलंब के लिए एजेंसी एवं दोषी पदाधिकारी/कर्मि पर कार्रवाई की जाए।

(ग) M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शून्य D.I. कराया जाना प्रतिवेदित है। इस पर पृच्छा किये जाने पर M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd. के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वे बिहार के एकमात्र सोलर लाईट उत्पादनकर्ता है, जिनका Plant बिहार में अवस्थित है। First lot का D.I. मानक के अनुसार नहीं पाये जाने के कारण lot reject कर दिया गया है। Empanelment एवं एकरारनामा के शर्तों के आलोक में D.I. हेतु पुनः Call raise करने तथा अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया। M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd. एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से चार माह बीत जाने के पश्चात भी PDI Raise करने में विलम्ब करना एवं सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य नहीं करने के कारण, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाए एवं इनको आवंटित लक्ष्य के अनुरूप निर्गत कार्यादेश को रद्द अथवा कटौती करने का आदेश विभाग स्तर से संबंधित जिला को संसूचित किया जाए।

2. प्रथम एवं द्वितीय चरण के लक्ष्य के अनुरूप सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की स्थिति:—

ब्रेडा द्वारा बताया गया है कि प्रथम चरण में 2,97,687 सोलर लाईट के निर्गत कार्यादेश के विरुद्ध 2,96,677 सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया जा चुका है, जो निर्गत कार्यादेश का 99% है। वहीं द्वितीय चरण में निर्गत कार्यादेश 3,25,033 के विरुद्ध 3,16,134 सोलर लाईट का अधिष्ठापन किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 97% है।

ब्रेडा द्वारा उपलब्ध कराए गए उपरोक्त डाटा के अवलोकन से स्पष्ट है कि एजेंसियों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में निर्गत किए गए कुल 6,22,720 कार्यादेश के विरुद्ध वर्तमान में लगभग 9,909 सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन शेष है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि विहित प्रावधानों के अनुसार पूर्व निर्गत कार्यादेश की समीक्षा की जाए एवं जिन एजेंसियों द्वारा फेज-1 एवं फेज-2 का कार्य अबतक पूर्ण नहीं किया गया है, उनके बचे हुए कार्यादेश को रद्द करते हुए उक्त लक्ष्य को नए एजेंसियों के बीच उनके कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता के आधार पर विभाग स्तर से आवंटित किया जाए।

उल्लेखनीय हो कि तृतीय चरण के लिए नए एजेंसियों का चयन एवं नए दर पर कार्य करने हेतु एकरारनामा किए जाने के पश्चात फेज-1 एवं फेज-2 के बचे हुए लक्ष्य को पूर्व के दर जो अधिक है, उस दर पर वर्तमान में कार्य किया जाना नियमसंगत नहीं होगा। विभाग स्तर से इसकी समीक्षा करते हुए चतुर्थ चरण हेतु बचे हुए लक्ष्य में सम्मिलित किया जाए।

3. CMS पर इंटीग्रेटेड अधिष्ठापित सोलर लाईट की स्थिति :-

ब्रेडा द्वारा PPT के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में कुल अधिष्ठापित 6,59,433 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट में से 5,50,052 अदद सोलर स्ट्रीट लाईट को विकसित प्रणाली CMS के साथ इंटीग्रेटेड कर ली गई है तथा अभी तक 1,09,381 सोलर स्ट्रीट लाईट इंटीग्रेशन हेतु अवशेष है।

ब्रेडा द्वारा उपलब्ध कराए गए उपरोक्त डाटा का एजेंसीवार समीक्षा किया गया। परंतु एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। यदि फेज-1 एवं फेज-2 में कार्यरत एजेंसियों द्वारा अधिष्ठापित सोलर लाईट के इंटीग्रेशन की संख्या देखी जाए तो आदर्श, ब्रिज एण्ड रूफ, ई-शार्प, जी.ई., आई.टी.आई., लार्डस, सैन, श्रीराम सागर, श्री सबितर, सैण्डगो के CMS पर इंटीग्रेशन हेतु काफी अधिक संख्या में सोलर स्ट्रीट लाईट बाकी है, जबकि इन एजेंसियों द्वारा गत वर्ष ही कार्य समाप्त कर दिया गया था।

इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न निदेश दिया गया :-

(क) केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली CMS पर पुराने एजेंसियों के नॉन-इंटीग्रेटेड सोलर स्ट्रीट लाईट को नन-फंक्शनल मानते हुए पेनाल्टी लगाई जाए।

(ख) पुरानी एजेंसियों के CMS पर शेष ऐसे Non-integrated SSL की जाँच कराई जाए एवं यदि इन एजेंसियों द्वारा 70% Non-integrated सोलर स्ट्रीट लाईट के ^{70%} राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तो दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।

(ग) अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट के कार्यस्थिति (कार्यरत/अकार्यरत) के अनुश्रवण हेतु चयनित Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd. एवं संबंधित एजेंसियों के साथ ब्रेडा द्वारा संयुक्त बैठक कर तकनीकी बिन्दुओं पर समीक्षा की जाए एवं यदि एकरारनामा में निहित शर्तों के अनुसार Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd. अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में उन दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा की जाए।

4. सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थिति:-

ब्रेडा के द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार दिनांक-20.05.2025 को CMS पर इंटीग्रेटेड 5,50,052 सोलर स्ट्रीट लाईट में से 31,653 सोलर लाईट 72 घंटों से अधिक अवधि से सिग्नल लॉस प्रदर्शित किया गया है तथा 1,983 सोलर लाईट 72 घंटों से अधिक अवधि से फॉल्टी पाया गया है।

Faulty Report above 6 Months

Sl. No.	Agency	No. SSL
1	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	1
2	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	108
3	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	1
4	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	6
5	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	1
Grand Total		117

विभागीय प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 31,635 सिग्नल लॉस एवं 1,983 फॉल्टी लाइट में से कई लाईट ऐसे हैं जो 6-6 महीनों से अधिक अवधि से खराब हैं। यदि एजेंसीवार देखा जाए तो मे0 लॉर्डस मार्क्स एवं मे0 श्री सबितर सोलर प्रा0लि0 का क्रमशः 165 एवं 284 अधिष्ठापित सोलर लाईट छः माह से अधिक अवधि से सिग्नल लॉस की समस्या आ रही है। दूसरी ओर फॉल्टी लाईट की संख्या देखी जाए तो मे0 लॉर्डस, मे0 श्री सबितर, मे0 राम सागर, मे0 सोलेक्स, मे0 आई.टी.आई. का छः माह से अधिक फॉल्टी लाईट की संख्या अधिक है।

चूँकि, प्रत्येक सोलर स्ट्रीट लाईट में लगे सिम का IMEI नम्बर होता है। विस्तृत प्रतिवेदन में पोलवार फॉल्टी एवं सिग्नल लॉस सोलर लाईट का सूची समय एवं तिथि के साथ उपलब्ध हो जाता है। इसकी विभाग स्तर पर गठित अनुश्रवण कोषांग के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अवगत एवं जांच कराई जाए।

उक्त के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि-

(क) ऐसे दोषी एजेंसियों को चिह्नित करते हुए 10 रुपये प्रति दिन प्रति सोलर लाईट के अनुसार 72 घंटों की अवधि के पश्चात् गणना करते हुए पेनाल्टी अधिरोपित की जाए।

(ख) एकरारनामा के शर्तों के अधीन ब्रेडा, पटना एवं विभाग द्वारा अत्यधिक दिनों से खराब सोलर स्ट्रीट लाईट के पार्ट्स यथा-लिथियम बैटरी, पी.वी. माड्यूल एवं ल्युमिनरी की रैंडमली NABL/MNRE प्रयोगशाला से जाँच कराते हुए संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अन्यान्य

उपरोक्त निदेशों के अतिरिक्त मा० मंत्री महोदय द्वारा निम्न निदेश दिए गए:—

(क) प्रत्येक दस हजार सोलर स्ट्रीट लाईट पर एक सर्विस स्टेशन अधिष्ठापित की जाए, जिसमें 10 प्रतिशत स्पेयर पार्ट्स रखा जाना सुनिश्चित की जाए। सभी कार्यकारी एजेंसी को 10,000 सोलर स्ट्रीट लाईट पर एक सर्विस स्टेशन स्थापित करना है। परंतु सोलर स्ट्रीट लाईट की अक्रियाशीलता, faulty, Signal loss संबंधी ऑकड़ों से यह प्रतीत होता है कि सर्विस स्टेशन अकार्यरत है। इसकी विशेष सूची तैयार कर सत्यापन सुनिश्चित कराये। प्रत्येक वेयर हाउस में रिमोट मॉनिटरिंग सुविधायुक्त CCTV कैमरा अधिष्ठापित की जाए तथा इन वेयर हाउस का अनुश्रवण मुख्यालय स्थित अनुश्रवण कोषांग एवं जिला स्तर से की जाए।

(ख) सोलर स्ट्रीट लाईट में उपयोग किये जाने वाले टाईप-बी सामग्रियों से संबंधित मान्यता प्राप्त वेंडरों की स्वीकृति ब्रेडा, पटना द्वारा दिए जाने के आलोक में टाईप-बी सामग्री हेतु चयनित एजेंसी की सूची ब्रेडा, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(ग) जिन एजेंसियों द्वारा Sublet किया जा रहा है, उन एजेंसियों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्रवाई की जाए।

(घ) सभी एजेंसियों द्वारा तृतीय चरण के सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन से संबंधित कार्य एकरारनामा की शर्तों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। एकरारनामा के शर्तों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में एजेंसियों के विरुद्ध संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा **Penalty/LD/Debarment/Blacklisting/Termination** की कार्रवाई की जाए। एजेंसियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में किये गये कार्य के प्रगति, गुणवत्ता, कार्यक्षमता के आधार पर समीक्षा कर सचिव, उर्जा विभाग एवं सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा एजेंसियों को A, B, C श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए। उक्त वर्गीकरण के आधार पर विभाग द्वारा चतुर्थ चरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि **CMS** एजेंसी **Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd.** द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा में अंतर है और कई विषयों पर एजेंसी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में **Amnex Infotechnologies Pvt. Ltd.** द्वारा एकरारनामा के शर्तों के तहत कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा ब्रेडा, पटना द्वारा की जाए एवं स्पष्ट प्रतिवेदन पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

(च) एजेंसी द्वारा बताया गया कि पंचायतों में अत्यधिक राशि भुगतान हेतु लंबित है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी से समीक्षा कर नियमानुसार भुगतान का निदेश दिया गया।

(छ) पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन संबंधी स्थानीय परेशानियों को जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी के स्तर से निराकरण करने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त निदेशों का त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश माननीय मंत्री द्वारा दिया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:—6प/रा०वि०आ०-02/2021(खंड)/6986/पं.रा. पटना, दिनांक 03/6/2025
प्रतिलिपि:—निदेशक, ब्रेडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि बैठक की कार्यवाही की प्रति कार्यान्वयन एजेंसी को भी उपलब्ध करायी जाये।

अनुलग्नक:—यथा उपर्युक्त।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:—6प/रा०वि०आ०-02/2021(खंड)/6986/पं.रा. पटना, दिनांक 03/6/2025
प्रतिलिपि:—सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज विभाग/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:—यथा उपर्युक्त।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:—6प/रा०वि०आ०-02/2021(खंड)/6986/पं.रा. पटना, दिनांक 03/6/2025
प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:—यथा उपर्युक्त।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव


ज्ञापांक:—6प/रा०वि०आ०-02/2021(खंड)/6986/पं.रा. पटना, दिनांक 03/6/2025
प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, अनुश्रवण कोषांग, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:—यथा उपर्युक्त।

(शम्स जावेद अंसारी)

संयुक्त सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार


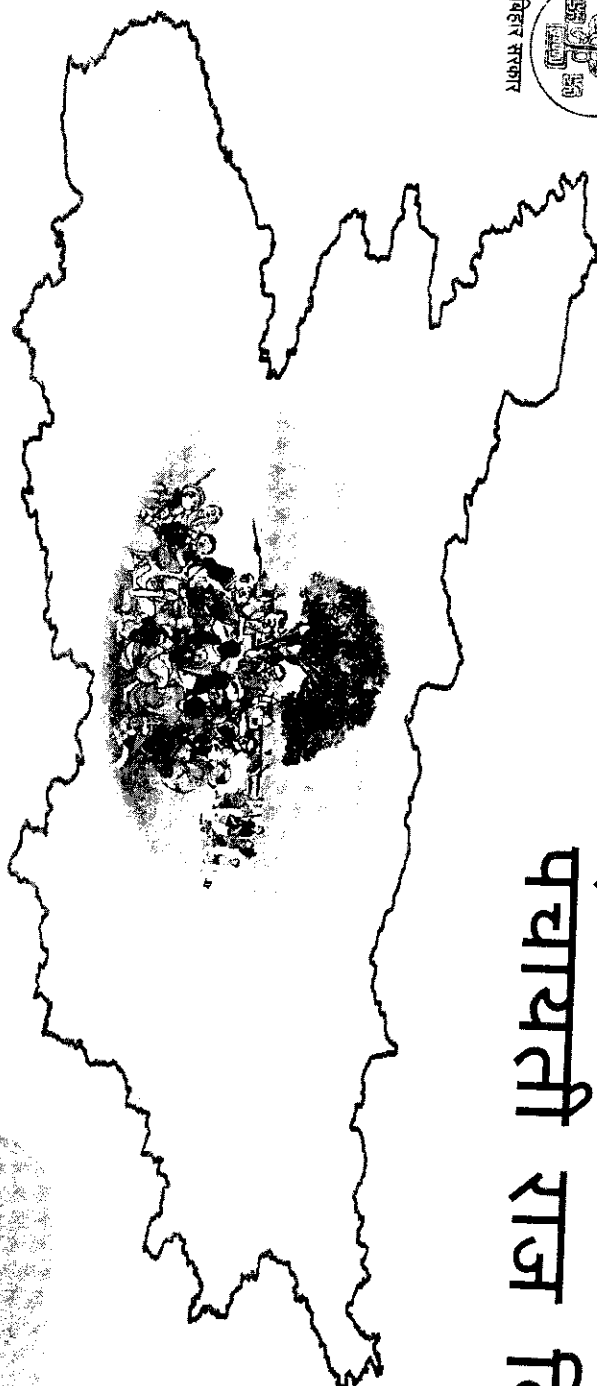


माननीय मंत्री,

पंचायती राज विभाग

की अध्यक्षता में

**मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की
समीक्षा बैठक**

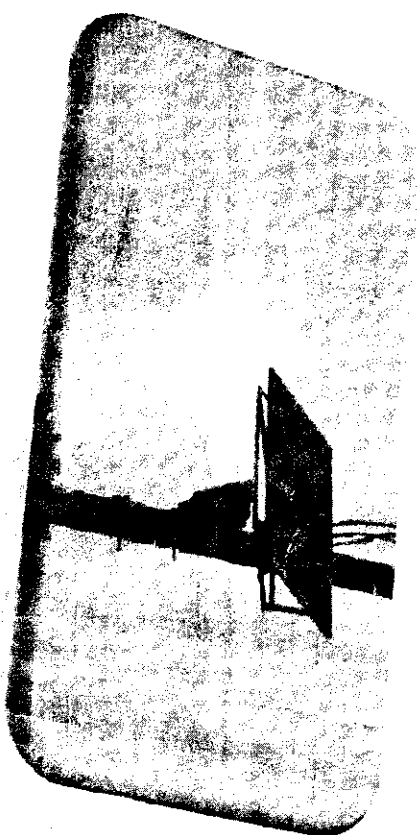

Date:-20.05.2025

<u>Sl.No</u>	<u>Descriptions</u>	<u>Page Number</u>
1	Status Of Dispatch Instruction (DI) By BREDA (For Phase-3)	<u>1-2</u>
2	Phase-III Work Order Dates	<u>3-4</u>
3	Phase-3 Agencies With Zero Installations / Integration On CMS	<u>5</u>
4	Installation Status (Agency-->Phase-->District Wise)	<u>6-14</u>
5	CMS Report for Solar Street Light Yojana	<u>15-26</u>

मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाईट योजना

Status Of Dispatch Instruction (DI) By BREDA-(For Phase-3)

Sl. No.	Name of Executing Agency	District Name	Work Order	DI Quantity			Installation	Installation Remaining
				Luminaire	Battery	PV Module		
1	M/s Lord's Mark Industries Pvt. Ltd.	East champaran	4400	4000	4400	1700	0	4400
		Jamui	6499	6100	6499	6499	351	6148
		Munger	2360	2360	2360	1700	0	2360
		Saran	6740	5450	5450	5450	0	6740
		✓ TOTAL	✓19999	✓17910	✓18709	✓15349	✓351	✓19648
		Aurangabad	5496	5496	5496	2008	0	5496
2	M/s ITI Ltd.	Patna	2010	2010	2010	2008	956	1054
		Muzaffarpur	4580	4580	4580	2000	0	4580
		Supaul	0	3820	3820	0	0	0
		✓ TOTAL	✓12086	✓15906	✓15906	✓4008	✓956	✓11130
		Sheikhpura	2770				0	2770
		Siemathi	6440				0	6440
3	M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd.	W. Champaran	4920				0	4920
		Samastipur	3380				0	3380
		✓ TOTAL	✓17510	0	0	0	0	✓17510
		Siwan	1230	1230	1230	1230	600	630
		Khagaria	2410	2410	2410	2410	400	2010
		Muzaffarpur	4460	4460	4460	4460	1100	3360
4	M/s Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd.	Banka	6170	6170	6170	6170	0	6170
		✓ TOTAL	14270	14270	14270	14270	2100	12170
		Bhagalpur	4390	1869	1000	1119	1900	3390
		Gaya	4120	4120	2128	3620	1770	2350
		Kishanganj	3599	1599	1000	1599	500	3099
		Madhubani	972	972	972	972	0	972
5	M/s Photonics Watertech Pvt. Ltd.	✓ TOTAL	13081	8560	5100	7310	3270	9811
		East champaran	4400	4400	4400	3730	0	4400
		Nalanda	3730	3730	3730	3730	857	2873
		Nawada	4470	4470	4470	4470	41	4429
		Patna	4678	4678	4678	4470	0	4678
		✓ TOTAL	17278	17278	17278	8200	898	16380
6	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd.	Gaya	4115	2200	2200	1600	690	3425
		Kaimur	4570	2400	2400	1600	299	4271
		W. Champaran	4340	2400	2400	1600	0	4340
		Samastipur	4060	2250	2400	1450	0	4060
		✓ TOTAL	17085	9250	9400	6250	989	16096
		Buxar	4570	4570	4570	1500	1500	3070
7	M/s Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd.	East champaran	4400	4400	4400	4400	1244	3156
		Kathar	4917				0	4917
		Siemathi	6530	5140	5140	4700	1702	4828
		✓ TOTAL	20417	14110	14110	10600	4446	15971
8	M/s Ganesh Green Bharat Ltd.							

Sl. No.	Name of Executing Agency	District Name	Work Order	Luminaire	DI Quantity	PV Module	Installation	Installation Remaining
9	M/s Anil Pomeg - Tech India Pvt. Ltd.	Nawada	4510	4510	4510	4510	866	3644
		Dharbhanga	2040	2040	2040	2040	856	1184
		Jehanabad	4258	4258	4258	4258	1128	3130
		East Champaran	4370	4370	4370	4370	0	4370
		TOTAL	15178	15178	15178	15178	2850	12328
10	M/s KILK Ventures Pvt. Ltd.	Panna	4840	4940	4940	4940	1199	3641
		Vaishali	5860	3000	3000	3000	0	5860
		W. Champaran	4710	3000	3000	4000	0	4710
		Saharsa	6450	3560	3560	3060	0	6450
		TOTAL	21860	14500	14500	15000	1199	20661
11	M/s Syska LED Lights Pvt. Ltd.	Araria	7890	2000	2000	2000	0	7890
		Aurangabad	5720	2500	2500	2500	554	5166
		Saran	6580	3000	3000	3000	568	6012
		W. Champaran	4920	3000	3000	3000	0	4920
		TOTAL	25110	10500	10500	10500	1122	23988
12	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd.	Arwal	1820	900	900	900	0	1820
		Bhagalpur	4400	1150	1150	1150	0	4400
		Madhubani	988	376	376	376	0	988
		Darbhanga	2040	2040	2040	2040	0	2040
		TOTAL	9248	4466	4466	4466	0	9248
13	M/s Sugs Lloyd Ltd.	Muzaffarpur	4320	4320	4320	4320	1110	3210
		Lakhisarai	3960	3960	3960	3960	801	3159
		Madhepura	3930	3930	3930	3930	921	3009
		Darbhanga	2030	2030	2030	2030	450	1580
		TOTAL	14240	14240	14240	14240	3282	10858
14	M/s EESL	Ethopur	5720	1000	1000	1000	0	5720
		Muzaffarpur	4320	2000	2000	2000	0	4320
		Siwan	1270	1270	1270	1000	0	1270
		Vaishali	5610	4450	4450	1000	0	5610
		TOTAL	16920	8720	8720	2000	0	16920
15	M/s Bondada Engg. Ltd.	Madhubani	964	964	964	964	0	964
		Purnea	4670	4670	4670	4670	500	4170
		Saran	6620	6620	6620	6620	2610	4010
		Rohas	4814	4810	4810	4810	540	4274
		TOTAL	17068	17064	17064	17064	3650	13418
16	M/s Agrowin Agri Solutions Pvt. Ltd.	Gaya	4110	4110	4110	4110	2208	1902
		Sheohar	2110	2110	2110	2110	770	1340
		Gopalganj	1250	1170	1170	1170	0	1250
		Madhubani	962	962	962	962	0	962
		TOTAL	8432	8352	7220	8352	2978	5454
17	M/s Suryam International Pvt. Ltd.	Begusarai	3760	2000	2000	2000	250	3510
		Madhepura	3939	2000	2000	2000	336	3603
		Siwan	6410	3040	3040	3040	0	6410
		Siwan	1230	1230	1230	1230	0	1230
		TOTAL	15339	8270	8270	9979	586	14753
GRAND TOTAL			275121	198574	194931	162766	28677	246444

17 letter

मुख्यमंत्री ग्रामीण सौरस्ट्रीट लाईट योजना

Phase-III Work Order Dates

Sl. No.	Agency	District	Work Order Issue Date	No. Of Days Since Work Order Issued
1	M/s Agrowin Agri Solutions Pvt. Ltd.	Gaya	31-12-2024 ✓	140 *
		Gopalganj	17-01-2025	123
		Madhubani	31-12-2024	140
		Sheohar	14-01-2025	126
		Darbhanga	15-01-2025	125
2	M/s Amit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd.	Jehanabad	31-12-2024	140
		Nawada	13-01-2025	127
		Motihari(Purbi Champaran)	18-01-2025	122
		Madhubani	26-12-2024	145
		Purnia	28-12-2024	143
3	M/s Bondada Engg. Ltd.	Rohitas	08-01-2025	132
		Saran	30-12-2024	141
		Bhojpur	17-01-2025	123
		Muzaffarpur	03-01-2025	137
		Siwan	17-01-2025	123
4	M/s Energy Efficiency Services Ltd.	Vaishali	25-01-2025	115
		Buxar	31-12-2024	140
		Katihar	16-01-2025	124
		Motihari	11-01-2025	129
		(Purbi Champaran)		
5	M/s Ganesh Green Bharat Ltd.	Siemathi	16-01-2025	124
		Aurangabad	07-01-2025	133
		Muzaffarpur	27-12-2024	144
		Patna	25-01-2025	115
		Supaul		
6	M/s ITI Limited	Banka	10-01-2025	130
		Khagaria	29-01-2025	111
		Muzaffarpur	15-01-2025	125
		Siwan	17-01-2025	123
		Bettiah	10-01-2025	130
7	M/s Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd.	(Paschim Champaran)		
		Patna	09-01-2025	131
		Saharsa	28-12-2024	143
		Vaishali	25-01-2025	115
8	M/s KKK Ventures Pvt. Ltd.			

एजेंसी का कार्यदेश रद्द कर दिया गया है।

Sl. No.	Agency	District	Work Order Issue Date	No. Of Days Since Work Order Issued
9	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd.	Arrai	11-01-2025	129
		Bhagalpur	26-12-2024	145
		Darbhanga	16-01-2025	124
		Madhubani	26-12-2024	145
		Jamui	14-01-2025	126
		Munger	31-12-2024	140
10	M/s Lord's Mark Industries Limited	Mothhari (Purbi Champaran)	21-01-2025	119
		Saran	02-01-2025	138
11	M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd.	Bettiah (Paschim Champaran)	10-01-2025	130
		Sheikhpura	13-12-2024	158
		Siemarni	16-01-2025	124
		Samastipur	13-02-2025	96
		Bhagalpur	26-12-2024	145
		Gaya	31-12-2024	140
		Kishanganj	09-12-2024	162
		Madhubani	31-12-2024	140
		Gaya	03-01-2025	137
		Kaimur	04-01-2025	136
13	M/s Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd.	Bettiah (Paschim Champaran)	10-01-2025	130
		Samastipur	04-02-2025	105
		Darbhanga	15-01-2025	125
		Lakhisarai	14-01-2025	126
		Madhepura	10-01-2025	130
		Muzaffarpur	08-01-2025	132
		Begusarai	09-01-2025	131
		Madhepura	10-01-2025	130
		Siemarni	16-01-2025	124
		Siwan	17-01-2025	123
		Araria	07-01-2025	133
		Aurangabad	08-01-2025	132
16	M/s Syska LED Light Pvt. Ltd.	Bettiah (Paschim Champaran)	10-01-2025	130
		Saran	02-01-2025	138
		Nalanda	09-12-2024	162
		Nawada	13-01-2025	127
		Patna	09-01-2025	131
17	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd.	Mothhari (Purbi Champaran)	11-01-2025	129

मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्टीट लाइट योजना

Phase-3 Agencies With Zero Installations / Integration On CMS

Sl. No.	Agency	Installed	Integrated On CMS
1	M/s Energy Efficiency Services Ltd., Lodhi road, New Delhi	0	0
2	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd., Secunderabad, Telangana	0	0
3	M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd., G.B. Nagar, UP	0	0

2-X08

2-X08

Installation Status - (Agency-->Phase-->District Wise)

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7
Grand Total :				9,25,276	6,44,537	70%
1	M/s Adarsh institute of social Economic Development	Phase_1	BANKA	720	720	100%
			BEGUSARAI	3170	3170	100%
			BHAGALPUR	1080	1080	100%
			DARBHANGA	2480	2480	100%
			JAMUI	1120	1120	100%
			KATIHAR	3400	3400	100%
			Phase_1 Total	11970	11970	100%
		Phase_2	BHAGALPUR	1500	1500	100%
			DARBHANGA	5000	5000	100%
			JAMUI	5340	4116	77%
			KATIHAR	13070	11394	87%
			KHAGARIA	5000	4880	98%
			Phase_2 Total	29910	26890	90%
		M/s Adarsh institute of social Economic Development Total		41880	38860	93%
		2	M/s Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd., Begusarai, Bihar	Phase_3	GAYA	4110
GOPALGANJ	1250				0	0%
MADHUBANI	962				0	0%
SHEOHAR	2110				770	36%
Phase_3 Total	8432				2978	35%
M/s Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd., Begusarai, Bihar Total				8432	2978	35%
Phase_3	DARBHANGA			2040	856	42%
	JEHANABAD			4258	1128	26%
	MOTIHARI			4370	0	0%
	(PUREI CHAMPARAN)			4510	866	19%
	NAWADA	15178	2850	19%		
M/s Amit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd., Mehsana, Gujarat Total		15178	2850	19%		
4	M/s Bondada Engg. Ltd., Hyderabad, Telangana	Phase_3	MADHUBANI	964	0	0%
			PURNIA	4670	500	11%
			Rohas	4814	540	11%
			SARAN	6620	2610	39%
			Phase_3 Total	17068	3650	21%
M/s Bondada Engg. Ltd., Hyderabad, Telangana Total		17068	3650	21%		

32

જાહેરાત અંગીકૃત કરવામાં આવેલ છે								
Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)		
5	M/s Bridge and Roof Co (I) Ltd.	Phase_1	BANKA	1880	1821	97%		
			BHAGALPUR	2960	2713	92%		
			DARBHANGA	4880	4880	100%		
			GOPALGANJ	3120	3080	99%		
			KATIHAR	1000	980	98%		
			KISHANGANJ	1780	1780	100%		
			MADHEPURA	1215	1215	100%		
			MADHUBANI	4920	4920	100%		
			PURNIA	1600	1513	95%		
			SARAN	3630	3014	83%		
			SIWAN	3760	3320	88%		
			SUPAUL	2850	2850	100%		
			Phase_1 Total			33595	32086	96%
			M/s Bridge and Roof Co (I) Ltd. Total			33595	32086	96%
			6	M/s Energy Efficiency Services Ltd., Lodhi road, New Delhi	Phase_3	BHOJPUR	5720	0
MUZAFFARPUR	4320	0				0%		
SIWAN	1270	0				0%		
VAISHALI	5610	0				0%		
Phase_3 Total						16920	0	0%
M/s Energy Efficiency Services Ltd., Lodhi road, New Delhi Total			16920	0	0%			
7	M/s E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd.	Phase_1	ARARIA	3080	3080	100%		
			BEGUSARAI	6170	6170	100%		
			JAMUI	3160	3140	99%		
			KAIMUR	1420	1420	100%		
			MADHEPURA	2680	2680	100%		
			NALANDA	3920	3880	99%		
			PURNIA	3000	3000	100%		
			SAHARSA	2720	2720	100%		
			SHEIKHPURA	1000	960	96%		
			Phase_1 Total			27150	27050	100%
			Phase_2			5190	5190	100%
			SAHARSA			3000	3000	100%
			Phase_2 Total			8190	8190	100%
			M/s E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd. Total			35340	35240	100%
			8	M/s Ganesh Green Bharat Ltd., Ahmedabad, Gujrat	Phase_3	BUXAR	4570	1500
KATIHAR	4917	0				0%		
MOTIHARI	4400	1244				28%		
(PURBI CHAMPARAN)	6530	1702				26%		
SITAMARHI	20417	4446				22%		
Phase_3 Total			20417	4446	22%			
M/s Ganesh Green Bharat Ltd., Ahmedabad, Gujrat Total			20417	4446	22%			

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
9	M/s GEIE Solar Products Ind. Pvt. Ltd.	Phase_1	ARARIA	2604	2604	100%
			KATIHAR	1560	1560	100%
			KISHANGANJ	8970	8970	100%
			MUNGER	1880	1865	99%
		Phase_1 Total	SIWAN	3880	3880	100%
				18894	18879	100%
			ARARIA	3850	3850	100%
			KISHANGANJ	3000	3000	100%
		Phase_2	SIWAN	3000	3000	100%
				9850	9850	100%
				28744	28729	100%
			ARARIA	6840	6840	100%
			DARBHANGA	3480	3480	100%
			GOPALGANJ	3120	3120	100%
10	M/s ITI Limited	Phase_1	KATIHAR	2800	2800	100%
			KHAGARIA	2320	2320	100%
			MOTIHARI	5410	5249	97%
			(PURI CHAMPARAN)	5000	5000	100%
			MUZAFFARPUR	3440	3440	100%
			PURNIA	14700	14700	100%
			SAMASTIPUR	13490	11878	88%
			SARAN	3680	3680	100%
		Phase_1 Total	SIWAN	64280	62507	97%
			ARARIA	6716	6010	89%
			DARBHANGA	12000	11160	93%
			GAYA	10000	10000	100%
			GOPALGANJ	15000	13250	88%
			KATIHAR	2800	2793	100%
			KHAGARIA	2550	2446	96%
			PATNA	3900	2944	75%
		Phase_2	PURNIA	11710	11657	100%
			SAMASTIPUR	9170	6770	74%
			SIWAN	13000	9558	74%
				86846	76588	88%
			AURANGABAD	5496	0	0%
			MUZAFFARPUR	4580	0	0%
			PATNA	2010	956	48%
				12086	956	8%
		Phase_3 Total		163212	140051	86%
			M/s ITI Limited Total			

महानगर अर्मीय सोवर रूटि वॉरिड चीजना

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order	
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]	
11	M/s Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd., Gurgaon, Haryana	Phase_3	BANKA	6170	0	0%	
			KHAGARIA	2410	400	17%	
			MUZAFFARPUR	4460	1100	25%	
			SIWAN	1230	600	49%	
			Phase_3 Total	14270	2100	15%	
		Phase_1	GAYA	14270	2100	15%	
			MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	4280	4280	100%	
			MUZAFFARPUR	3680	3680	100%	
			NALANDA	1920	1920	100%	
			PATNA	2870	2870	100%	
			Rohas	4020	4020	100%	
12	M/s KLK Ventures Pvt.Ltd	Phase_1	Phase_1 Total	10990	10500	96%	
			GAYA	27760	27270	98%	
			MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	4000	4000	100%	
			MUZAFFARPUR	7960	7775	98%	
			PATNA	4000	4000	100%	
		Phase_2	Phase_2 Total	3040	3020	99%	
			BETTIAH (PASCHIM CHAMPARAN)	19000	18795	99%	
			PATNA	4710	0	0%	
			SAHARSA	4840	1199	25%	
			VAISHALI	6450	0	0%	
		Phase_3	Phase_3 Total	5860	0	0%	
Phase_3 Total	21860		1199	5%			
M/s KLK Ventures Pvt.Ltd Total	68620		47264	69%			
13	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd., Secunderabad, Telangana		Phase_3	ARWAL	1820	0	0%
				BHAGALPUR	4400	0	0%
				DARBHANGA	2040	0	0%
		MADHUBANI		988	0	0%	
		Phase_3 Total		9248	0	0%	
		Phase_1	M/s Landsky Engg. Pvt. Ltd., Secunderabad, Telangana Total	9248	0	0%	

10						
Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
14	M/s Lords Mark Industries Pvt. Ltd.	Phase_1	BEGUSARAI	2880	2880	100%
			BETTIAH (PASCHIM CHAMPARAN)	1240	1240	100%
			BHAGALPUR	2480	2480	100%
			DARBHANGA	1480	1480	100%
			KHAGARIA	2350	2350	100%
			LAKHISARAI	680	680	100%
			MADHUBANI	2640	2640	100%
			MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	2960	2960	100%
			NALANDA	7600	7526	99%
			SAMASTIPUR	3480	3480	100%
			SHEIKHPURA	960	960	100%
			Phase_1 Total	28750	28676	100%
			BEGUSARAI	4220	4220	100%
			LAKHISARAI	2270	2270	100%
15	M/s Lords Mark Industries Pvt. Ltd.	Phase_2	MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	2000	1605	80%
			NALANDA	6620	5675	86%
			Phase_2 Total	15110	13770	91%
			JAMUI	6499	351	5%
			MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	4400	0	0%
			MUNGER	2360	0	0%
			SARAN	6740	0	0%
			Phase_3 Total	19999	351	2%
			Phase_3 Total	63859	42797	67%
			BETTIAH (PASCHIM CHAMPARAN)	4920	0	0%
			SAMASTIPUR	3380	0	0%
			SHEIKHPURA	2770	0	0%
			SITAMARHI	6440	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
15	M/s Naw Dharam Energy Pvt. Ltd., G.B. Nagar, UP	Phase_3	BETTIAH (PASCHIM CHAMPARAN)	4920	0	0%
			SAMASTIPUR	3380	0	0%
			SHEIKHPURA	2770	0	0%
			SITAMARHI	6440	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%
			Phase_3 Total	17510	0	0%

229

જાહેરાતી ગ્રામીણ મોબાઇલ ફોન વાઇડ વોર્ક યોજના						
Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
16	M/s Photonics Watertech Pvt. Ltd	Phase_1	BHOJPUR	4560	4440	97%
			GAYA	1040	1040	100%
			JEHANABAD	2640	2640	100%
			MUZAFFARPUR	3120	3120	100%
			NAWADA	3680	3680	100%
			PATNA	800	724	91%
			Rohias	2160	2120	98%
			SHEOHAR	1040	1040	100%
			SITAMARHI	2680	2680	100%
			VASHALI	2800	2560	91%
			Phase 1 Total	24520	24044	98%
		Phase_2	JEHANABAD	2000	1840	92%
			NAWADA	3000	2150	72%
		Phase 2 Total	BHAGALPUR	5000	3990	80%
			GAYA	4390	1000	23%
		Phase_3	KISHANGANJ	4120	1770	43%
			MADHUBANI	3599	500	14%
		Phase 3 Total		972	0	0%
				13081	3270	25%
		M/s Photonics Watertech Pvt. Ltd Total		42601	31304	73%
17	M/s Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd., Ahmedabad, Gujarat	Phase_3	(PASCHIM CHAMPARAN)	4340	0	0%
			GAYA	4115	680	17%
			KAIMUR	4570	299	7%
			SAMASTIPUR	4060	0	0%
			Phase 3 Total	17085	989	6%
		Phase 3 Total	BETTIAH	17085	989	6%
			(PASCHIM CHAMPARAN)	4280	4260	100%
			BHOJPUR	7660	7620	99%
			BUXAR	3160	3160	100%
			KAIMUR	5120	5120	100%
			SHEOHAR	1080	1080	100%
			SITAMARHI	3520	3400	97%
			VASHALI	3600	3600	100%
			Phase 1 Total	28420	28240	99%
			AURANGABAD	4000	3980	100%
			BETTIAH	4000	3983	100%
			(PASCHIM CHAMPARAN)	5000	4140	83%
			BHOJPUR	7800	5500	71%
			BUXAR	4870	4788	98%
			KAIMUR	8670	5530	64%
			Rohias	2000	2000	100%
			SHEOHAR	36340	29921	82%
			Phase 2 Total	64760	58161	90%
		M/s San Energy and Solution Total				
18	M/s San Energy and Solution	Phase_1	BETTIAH	4340	0	0%
			(PASCHIM CHAMPARAN)	4115	680	17%
			GAYA	4570	299	7%
			KAIMUR	4060	0	0%
			SAMASTIPUR	17085	989	6%
			Phase 3 Total	17085	989	6%
		Phase 3 Total	BETTIAH	17085	989	6%
			(PASCHIM CHAMPARAN)	4280	4260	100%
			BHOJPUR	7660	7620	99%
			BUXAR	3160	3160	100%
			KAIMUR	5120	5120	100%
			SHEOHAR	1080	1080	100%
			SITAMARHI	3520	3400	97%
			VASHALI	3600	3600	100%
			Phase 1 Total	28420	28240	99%
			AURANGABAD	4000	3980	100%
			BETTIAH	4000	3983	100%
			(PASCHIM CHAMPARAN)	5000	4140	83%
			BHOJPUR	7800	5500	71%
			BUXAR	4870	4788	98%
			KAIMUR	8670	5530	64%
			Rohias	2000	2000	100%
			SHEOHAR	36340	29921	82%
			Phase 2 Total	64760	58161	90%
		M/s San Energy and Solution Total				

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
19	M/s Shri Ram Sagar Construction	Phase_1	BETIAH	3880	3800	98%
			(PASCIM CHAMPARAN)			
			BHOJPUR	5740	5740	100%
			MADHUBANI	5320	5320	100%
			MOTIHARI	3920	3826	98%
			(PURBI CHAMPARAN)			
			PATNA	3200	3120	98%
			Rohas	3240	3240	100%
			SAMASTIPUR	11580	10370	90%
			SITAMARHI	4120	4120	100%
			VAISHALI	4680	4680	100%
		Phase_1 Total		45680	44216	97%
		Phase_2	MOTIHARI	2000	1180	59%
			(PURBI CHAMPARAN)			
			MUZAFFARPUR	5000	5000	100%
			SAMASTIPUR	3980	1230	31%
		Phase_2 Total	VAISHALI	8800	8500	97%
				19780	15910	80%
				65460	60126	92%
				1110	1110	100%
20	M/s Solex Energy Limited	Phase_1	AURANGABAD	1800	1800	100%
			BUXAR	2280	2280	100%
			GAYA	2320	2320	100%
			JEHANABAD	880	880	100%
			NALANDA	3910	3910	100%
			PATNA	4400	4274	97%
			SAHARSA	2680	2610	97%
			SUPAUL	7740	7630	99%
				27120	26814	99%
				2000	2000	100%
		Phase_2	MADHEPURA	2500	2448	98%
			PATNA	3060	3039	99%
			SUPAUL	8260	6673	81%
				15620	14160	90%
		Phase_2 Total		42940	40974	95%
		M/s Solex Energy Limited Total		42940	40974	95%

भारतीय ग्रामीण सौर रूपांक गाईड योजना

13

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
21	M/s Sri Savitr Solar Pvt. Ltd.	Phase_1	ARWAL	2580	2580	100%
			AURANGABAD	3120	3120	100%
			BANKA	5910	5903	100%
			BEGUSARAI	3580	3580	100%
			BHAGALPUR	3000	3000	100%
			GAYA	2480	2480	100%
			LAKHISARAI	1560	1560	100%
			MUNGER	2340	2340	100%
			MUZAFFARPUR	4880	4880	100%
			NAWADA	3600	3600	100%
		Phase_1 Total		33050	33043	100%
		Phase_2	ARWAL	2290	2281	100%
			BANKA	5530	5460	99%
			BEGUSARAI	4500	4500	100%
			BHAGALPUR	6850	6850	100%
			MADHUBANI	3480	3480	100%
		Phase_2 Total		4610	4610	100%
		M/s Sri Savitr Solar Pvt. Ltd. Total		27260	27181	100%
				60310	60224	100%
		Phase_3	DARBHANGA	2030	450	22%
			LAKHISARAI	3960	801	20%
			MADHEPURA	3930	921	23%
			MUZAFFARPUR	4320	1110	26%
		Phase_3 Total		14240	3282	23%
		M/s Sugs Lloyd Ltd., Delhi Total		14240	3282	23%
		Phase_1	AURANGABAD	1730	1690	98%
			GAYA	1320	1320	100%
			GOPALGANJ	2810	2810	100%
		Phase_1 Total		5860	5820	99%
		M/s Sundigo Solar Solutions Pvt.Ltd Total		5860	5820	99%
22	M/s Sugs Lloyd Ltd., Delhi					
23	M/s Sundigo Solar Solutions Pvt.Ltd					

224

Sl. No.	Agency	Phase	District	Work Order given for No. of SSLs	Installed No. Of SSLs	% Installation/Work Order
1	2	3	4	5	6	7 [6/5]
24	M/s Suryam International Pvt. Ltd., Bhubaneswar, Orissa	Phase_3	BEGUSARAI	3760	250	7%
			MADHEPURA	3939	336	9%
			SITAMARHI	6410	0	0%
			SIWAN	1230	0	0%
		Phase_3 Total	15339	586	4%	
	M/s Suryam International Pvt. Ltd., Bhubaneswar, Orissa Total			15339	586	4%
			ARARIA	7890	0	0%
			AURANGABAD	5720	554	10%
			BETTIAH (PASCHIM CHAMPARAN)	4920	0	0%
25	M/s Syska LED Lights Pvt. Ltd., Pune, Maharashtra	Phase_3	SARAN	6580	568	9%
			Phase_3 Total	25110	1122	4%
			M/s Syska LED Lights Pvt. Ltd., Pune, Maharashtra Total	25110	1122	4%
26	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd., Gautam Budh Nagar, UP	Phase_3	MOTIHARI (PURBI CHAMPARAN)	4400	0	0%
			NALANDA	3730	857	23%
			NAWADA	4470	41	1%
			PATNA	4678	0	0%
		Phase_3 Total	17278	898	5%	
	M/s Visual Technologies India Pvt. Ltd., Gautam Budh Nagar, UP Total			17278	898	5%
			Grand Total :			9,25,276

CMS Report for Solar Street Light Yojana

Sl. No.	Agency	District	Installed No. Of SSLs	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/ Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
	Grand Total		644537	540652	84%	29144	1983
1	M/S Aadarsh Institute of Social Economic Direct SSLs	AURANGABAD		7		3	
		BANKA	720	280	39%	99	3
		BEGUSARAI	3170	2782	88%	1452	2
		BHAGALPUR	2580	1867	72%	733	7
		BHOJPUR		10		7	
		BUXAR		1		0	
		DARBHANGA	7480	4763	64%	2472	9
		JAMUI	5236	4083	78%	4064	18
		JEHANABAD		3		3	
		KAIMUR		2		1	
		KATIHAR	14794	12274	83%	1372	13
		KHAGARIA	4880	2041	42%	1423	26
		MADHUBANI		0		0	
		MUZAFFARPUR		1		1	
		NAWADA		1		1	
		BETTIAH		5		4	
		ROHTAS		7		4	
		SHEOHAR		1		1	
		SITAMARHI		2		1	
		VAISHALI		2		1	
		TOTAL	38860	28132	72%	11642	78
2	M/S Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd	GAYA	2208	607	27%	129	7
		MADHUBANI		48		0	
		SHEOHAR	770	148	19%	0	
		TOTAL	2978	803	27%	129	7
3	M/s Arnit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd	DARBHANGA	856	480	56%	0	
		JEHANABAD	1128	1117	99%	0	
		NAWADA	866	608	70%	0	
		TOTAL	2850	2205	77%	0	0

4-X08

Sl. No.	Agency	District	Installed No. Of SSLs	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
4	M/S Bondada Engineering Limited	MADHUBANI	0	754		1	
		PURNIA	500	383	77%	5	
		ROHTAS	540	448	83%	0	1
		SARAN	2610	2290	88%	177	
		TOTAL	3650	3875	106%	183	1
		ARARIA		73		0	
		BANKA	1821	1854	102%	15	6
		BHAGALPUR	2713	2625	97%	905	7
		DARBHANGA	4880	4521	93%	446	6
		GOPALGANJ	3080	3001	97%	0	4
5	M/s Bridge And Roof Co Limited for direct SSLs	JAMUI		14		0	
		KATIHAR	980	820	84%	29	9
		KISHANGANJ	1780	1813	102%	1	
		MADHEPURA	1215	1113	92%	18	2
		MADHUBANI	4920	5305	108%	620	23
		MUZAFFARPUR		1		0	
		PURNIA	1513	1288	85%	42	13
		SARAN	3014	2300	76%	30	7
		SIWAN	3320	2331	70%	314	3
		SUPAUL	2850	2213	78%	1	2
		TOTAL	32086	29272	91%	2421	82
		ARARIA	3080	3116	101%	1	
		BEGUSARAI	6170	6085	99%	166	11
		JAMUI	3140	2167	69%	0	
		KAIMUR	1420	453	32%	0	
6	M/S E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd Direct SSLs	MADHEPURA	2680	2687	100%	0	
		NALANDA	3880	3819	98%	22	
		PATNA		4		0	
		BETTIAH		1			
		PURNIA	8190	8133	99%	51	6
		SAHARSA	5720	5601	98%	21	1
		SHEIKHPURA	960	898	94%	11	2
		TOTAL	35240	32964	94%	272	20

220

Sl. No.	Agency	District	Installed No. Of SSLS	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
10	M/S Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd	BANKA		0	0%		
		MUZAFFARPUR	1100	0			
		KHAGARIA	400	431	108%		
		SIWAN	600	536	89%		
		TOTAL	2100	967	46%	0	0
		BETIAH		455		5	2
		GAYA	8280	8267	100%	340	21
		MUZAFFARPUR	5920	5920	100%	163	19
		NALANDA	2870	2879	100%	83	11
		PATNA	8239	7873	96%	462	131
11	M/S Kik Ventures Private Limited Direct SSLS	MOTIHARI	11465	11387	99%	443	39
		ROHTAS	10500	10390	99%	232	29
		SAHARSA		351		2	
		TOTAL	47264	47522	101%	1730	252
		BANKA		11		0	
		BEGUSARAI	7100	5472	77%	665	72
		BETIAH	1240	648	52%	53	6
		BHAGALPUR	2480	1543	62%	194	23
		BHOJPUR		17		0	1
		DARBHANGA	1480	1218	82%	73	17
12	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	JAMUI	351	9	3%	0	1
		JEHANABAD		54		7	
		KATI HAR		4		0	
		KHAGARIA	2350	1790	76%	180	31
		LAKHISARAI	2950	2290	78%	96	26
		MADHUBANI	2640	1709	65%	134	16
		MOTIHARI	4565	1913	42%	103	23
		MUNGER		10		0	
		MUZAFFARPUR		30		0	
		NALANDA	13201	8564	65%	1273	225
		NAWADA		15		1	
		PATNA		2		0	
		ROHTAS		1		0	
		SAMASTIPUR	3480	2419	70%	105	26
		SHEIKHPURA	960	646	67%	45	20
		SHEOHAR		5		0	
		SITAMARHI		7		0	
		VAISHALI		2		0	
		TOTAL	42797	28379	66%	2929	487

Sl. No.	Agency	District	Installed No. of SSLs	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
13	M/S Photonics Watertech Private Limited Direct	BHAGALPUR	1000	659	66%	0	19
		BHOJPUR	4440	4425	100%	128	3
		GAYA	2810	2792	99%	26	4
		JEHANABAD	4480	4633	103%	92	
		KISHANGANJ	500	343	69%	0	
		MADHUBANI	3120	2978	95%	5	
		MUZAFFARPUR	5830	5137	88%	44	
		NAWADA	724	717	99%	108	7
		PATNA	2120	2078	98%	20	1
		ROHTAS	1040	969	93%	30	
		SITAMARHI	2680	2662	99%	28	2
		VAISHALI	2560	1927	75%	46	2
		TOTAL	31304	30247	97%	27	1
14	M/S Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd	GAYA	690	660	96%	554	20
		KAIMUR	299	296	99%	121	2
		TOTAL	989	956	97%	109	1
		AURANGABAD	3980	3823	96%	230	3
		BHAGALPUR	11760	9553	81%	0	
		BHOJPUR	8660	8384	97%	7	
		KAIMUR	9908	8576	87%	15	
		BETTIAH	8243	7681	93%	13	3
		ROHTAS	5530	4774	86%	8	
		SHEIKHPURA	3080	2869	93%	0	
15	M/S San Energy And Solution for Direct SSLS	SHEOHAR	3400	3159	93%	0	
		SITAMARHI	3600	2977	83%	0	
		VAISHALI	58161	53225	92%	43	3
		TOTAL	58161	53225	92%	43	
		ARWAL	5740	4340	76%	1	
		AURANGABAD	5740	4340	76%	1	
		BHOJPUR	5740	4340	76%	1	
		BUXAR	5740	4340	76%	1	
		KAIMUR	5740	4340	76%	1	
		MADHUBANI	5740	4340	76%	1	
16	M/s Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	MUZAFFARPUR	5320	2803	53%	1	2
		BETTIAH	5000	5328	107%	48	5
		PATNA	3800	2959	78%	199	27
		MOTIHARI	3120	2408	77%	8	0
		ROHTAS	5006	2300	46%	13	1
		SAMASTIPUR	3240	2285	71%	76	9
		SITAMARHI	11600	9613	83%	77	8
		VAISHALI	4120	3359	82%	287	21
		TOTAL	13180	8810	67%	200	10
		TOTAL	60126	44215	74%	1176	39
						2414	139

Sl. No.	Agency	District	Installed No. Of SSLs	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
17	M/s Solex Energy Limited Direct SLS	ARWAJ	1110	941	85%	2	1
		AURANGABAD	1800	1721	96%	6	6
		BUXAR	4280	4057	95%	4	2
		GAYA	2320	2095	90%	22	4
		JEHANABAD	880	1223	139%	19	8
		KATIHAR		4	105%	0	7
		MADHEPURA	2448	2566	105%	6	11
		NALANDA	3910	3505	90%	160	11
		PATINA	7313	7077	97%	34	33
		SAHARSA	2610	2694	103%	5	6
		SUPAUL	14303	14221	99%	12	45
		TOTAL	40974	40104	98%	270	123
		ARARIA		4		0	42
		ARWAJ	4861	3925	81%	336	22
		AURANGABAD	3120	1991	64%	262	22
		BANKA	11363	7711	68%	670	55
		BEGUSARAI	8080	4589	57%	267	140
18	M/S Sri Savitr for Direct SLS	BHAGALPUR	9850	8200	83%	499	22
		BHOJPUR		4		2	
		BUXAR		3		1	7
		GAYA	2480	1415	57%	205	
		KAIMUR		2		1	17
		LAKHISARAI	1560	1507	97%	342	17
		MADHUBANI	3480	2994	86%	258	8
		MUNGER	6950	5834	84%	271	28
		MUZAFFARPUR	4880	2771	57%	39	3
		NAWADA	3600	1665	46%	89	2
		BETIAH		4		2	
		ROHTAS		1		1	
		SAMASTIPUR		0		0	
		SITAMARHI		3		1	
		VAISHALI		2		3247	346
		TOTAL	60224	42625	71%	7	
19	M/S Sugs Lloyd Ltd	DARBHANGA	450	268	60%	20	2
		LAKHISARAI	801	592	74%	18	4
		MADHEPURA	921	413	45%	17	
		MUZAFFARPUR	1110	756	68%		
		VAISHALI		1		62	6
		TOTAL	3282	2030	62%		

01 of 8 E-14534 16496 5101

104815 44169/2447 - 709

216

Sl. No.	Agency	District	Installed No. Of SSLs	No. of SSL Integrated on CMS	% CMS Integration/Installation	No. of SSL having Signal Loss above 72hrs	No. of faulty SSL above 72hrs
20	M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS	AURANGABAD	1690	740	44%	0	
		BHOJPUR		1		0	
		BUXAR		1		0	
		GAYA	1320	1002	76%	344	8
		GOPALGANJ	2810	2171	77%	9	
		ROHTAS		1		0	
		TOTAL	5820	3916	67%	353	8
21	M/S Suryam International Pvt. Ltd	BEGUSARAI	250	250	100%	8	1
		MADHEPURA	336	259	77%	3	
		TOTAL	586	509	87%	11	1
		AURANGABAD	554	889	160%	13	2
22	M/S Syska LED Lights Pvt. Ltd	SARAN	568	1082	190%	32	2
		TOTAL	1122	1971	176%	45	4
		NALANDA	857	410	48%	18	1
		NAWADA	41	0	0%		
23	M/S Visual Technologies India Pvt. Ltd.	TOTAL	898	410	46%	18	1
Grand Total			644537	540652	84%	29144	1983

Sr.No.	Agency	19.05.2025	16.05.2025	15.05.2025	14.05.2025	13.05.2025	09.05.2025	08.05.2025	07.05.2025	05.05.2025	02.05.2025	30.04.2025
1	M/S Aadarsh Institute of Social Economic Direct SSLS	30485	28129	28129	32068	29655	27947	27947	27943	20769	20740	32555
2	M/S Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd	803	677	628	601	598	583	578	571	563	556	549
3	M/S Amit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd	2204	2095	2020	1882	1827	1370	1370	1370	1370	1370	1218
4	M/S Bondada Engineering Limited	3876	3566	3566	3691	3691	2135	2135	2135	2135	2135	2135
5	M/S Bridge And Roof Co Limited for direct SSLS	29269	29271	29271	29303	27601	29303	29303	29303	29303	29303	29578
6	M/S E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd Direct SSLS	32960	32963	32964	32964	32964	32961	32964	32964	32964	32964	32963
7	M/S Ganesh Green Bharat Limited	4545	3982	3686	3680	3664	2493	2470	2448	2444	2418	2134
8	M/S GEIE Solar Products India Pvt. Ltd for direct SSLS	27886	27797	27728	27676	26162	26584	26586	26586	26586	26595	26423
9	M/S ITI Limited Direct SSLS	113908	113796	113761	116732	116709	116373	116311	116227	116178	115959	115444
10	M/S Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd	967	879	834	814	733	268	268	268	268	268	229
11	M/S Kik Ventures Private Limited Direct SSLS	47448	47452	46365	46734	46727	46295	46287	46282	46268	46260	46208
12	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	28367	28365	28362	29586	29303	28615	28607	28602	27050	27016	26971
13	M/S Photonics Watertech Private Limited Direct SSLS	30240	30001	29653	29654	29583	29657	27136	27136	27136	27136	27137
14	M/S Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd	956	955	955	962	734	726	215	215	215	214	100
15	M/S San Energy And Solution for Direct SSLS	53210	52521	53204	56182	55970	56244	54875	54873	54871	54778	54102
16	M/S Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	44256	43706	43630	44319	44246	43578	43573	43568	43562	43564	43873
17	M/S Solex Energy Limited Direct SSLS	40104	40106	40106	40106	36306	36306	36306	36306	36306	36307	36455
18	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	42622	42599	42229	42449	42364	42033	42034	42031	42025	42300	42405
19	M/S Sugs Lloyd Ltd	2007	1946	1369	1336	1305	748	747	743	737	719	523
20	M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS	3916	3915	3915	3915	3915	3915	3915	3914	3914	3914	3914
21	M/S Suryam International Pvt. Ltd	502	346	282	257	124						
22	M/S Syska LED Lights Pvt. Ltd	1971	1514	1366	1245	1085	40	40	39	39	34	
23	M/S Visual Technologies India Pvt. Ltd.	410	93	93	163	114	121	3	3	3	3	1
Grand Total		542912	536674	534116	546319	535380	528295	523670	523527	514706	514553	524917

1/2

SSL Signal Loss Above 6 months as per CMS Portal (19.05.2025)

Agency	District	No. Of SSL
M/S Sri Savitr for Direct SSLS	BANKA	93
	AURANGABAD	50
	MUNGER	38
	NAWADA	32
	BHAGALPUR	29
	ARWAL	21
	BEGUSARAI	19
	GAYA	2
	TOTAL	284
	NALANDA	34
	KHAGARIA	27
	SAMASTIPUR	26
	MADHUBANI	26
	BEGUSARAI	11
M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	DARBHANGA	11
	BHAGALPUR	10
	PURBI CHAMPARAN	8
	LAKHISARAI	7
	SHEIKHPURA	3
	PASHCHIM CHAMPARAN	2
	TOTAL	165
	VAISHALI	8
	SITAMARHI	2
	TOTAL	10
M/s Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	KHAGARIA	2
	KATIHAR	1
	TOTAL	3
M/S Aadarsh Institute of Social Economic Direct SSLS	GAYA	1
	TOTAL	1
M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS		
Grand Total		463

SSR Monthly Report - 2019 Date: 11/05/2019

Time: 8:00 PM - 10:00 PM

24

Sl. No.	Agency	Total Integrated	ON	% ON	OFF	Signal loss	Faulty lights
1	M/S ITI Limited Direct SSLS	113879	21640	19%	9085	80320	2834
2	M/S San Energy And Solution for Direct SSLS	51028	34102	67%	379	15732	815
3	M/S Kik Ventures Private Limited Direct SSLS	47425	31890	67%	409	14770	356
4	M/s Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	44207	22332	51%	334	20891	650
5	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	42597	21697	51%	321	20111	468
6	M/s Solex Energy Limited Direct SSLS	40104	0	0%	0	40104	0
7	M/S E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd Direct SSLS	32958	13403	41%	1916	17575	64
8	M/S Photonics Watertech Private Limited Direct SSLS	30240	1188	4%	10	29015	27
9	M/s Bridge And Roof Co Limited for direct SSLS	29269	8635	30%	161	20024	449
10	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	28362	1878	7%	307	25550	627
11	M/s GEIE Solar Products India Pvt. Ltd for direct SSLS	27876	7011	25%	3202	17599	64
12	M/S Aadarsh Institute of Social Economic Direct SSLS	25706	219	1%	58	25367	62
13	M/S Ganesh Green Bharat Limited	4073	2434	60%	15	1550	74
14	M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS	3916	916	23%	29	2943	28
15	M/S Bondada Engineering Limited	3875	3595	93%	80	183	17
16	M/s Amit Pomeg-Tech India Pvt. Ltd	2204	0	0%	0	2204	0
17	M/S Sugs Lloyd Ltd	1998	1636	82%	33	208	121
18	M/S Syska LED Lights Pvt. Ltd	1845	1524	83%	39	208	74
19	M/S Jai Auto Vehicles Pvt. Ltd	967	0	0%	0	967	0
20	M/S Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd	956	624	65%	46	252	34
21	M/S Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd	800	195	24%	3	519	83
22	M/S Suryam International Pvt. Ltd	481	387	80%	10	63	21
23	M/S Visual Technologies India Pvt. Ltd.	409	27	7%	2	379	1
Grand Total		535175	175333	33%	16439	336534	6869



SSL Signal loss from 15th Nov 2024 to 16th April 2025 as per CMS portal

Sr. No.	Agency	No. Of SSL
1	M/S Aadarsh Institute of Social Economic Direct SSLS	2001
2	M/S Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd	126
3	M/S Bondada Engineering Limited	183
4	M/s Bridge And Roof Co limited for direct SSLS	2420
5	M/S E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd Direct SSLS	270
6	M/S Ganesh Green Bharat Limited	44
7	M/s GEIE Solar Products India Pvt. Ltd for direct SSLS	13
8	M/S ITI Limited Direct SSLS	2501
9	M/S Kik Ventures Private Limited Direct SSLS	1675
10	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	2719
11	M/S Photonics Watertech Private Limited Direct SSLS	118
12	M/S Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd	225
13	M/S San Energy And Solution for Direct SSLS	40
14	M/s Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	1414
15	M/s Solex Energy Limited Direct SSLS	269
16	M/S Sri Savitr for Direct SSLS	2008
17	M/S Sugs Lloyd Ltd	59
18	M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS	351
19	M/S Suryam International Pvt. Ltd	11
20	M/S Syska LED Lights Pvt. Ltd	41
21	M/S Visual Technologies India Pvt. Ltd.	18
Grand Total		16506

22

SSL Hourly Report					18.05.2025 8 PM - 10 PM					18.05.2025 10 PM - 11:59 PM					19.05.2025 12:00 AM - 2:00 AM					19.05.2025 2:00 AM - 4:00 AM				
Sl. No.	Agency	Total Integrated	ON	OFF	Signal loss	Faulty lights	ON	OFF	Signal loss	Faulty lights	ON	OFF	Signal loss	Faulty lights	ON	OFF	Signal loss	Faulty lights						
1	M/S Aadars Institute of Social Economic Direct SSLS	25706	219	58	25367	62	1859	52	23597	198	203	39	25193	271	1697	56	23731	222						
2	M/S Agrowin Agri Solution Pvt. Ltd	800	195	3	519	83	509	8	237	46	231	5	534	30	523	8	232	37						
3	M/S Amit Pomeg.Tech India Pvt. Ltd	2204	0	0	2204	0	2121	45	1	37	0	0	2204	0	0	0	2204	0						
4	M/S Bondada Engineering Limited	3875	3595	80	183	17	3573	98	183	21	3562	104	183	26	3544	117	183	31						
5	M/S Bridge And Roof Co Limited for direct SSLS	29269	8635	161	20024	449	12110	155	16410	594	12270	176	16183	640	9547	198	18629	895						
6	M/S E-Sharp Solar Solution Pvt. Ltd Direct SSLS	32958	13403	1916	17575	64	16680	196	15853	229	15300	135	17396	127	203	14	32713	28						
7	M/S Ganesh Green Bharat Limited	4073	2434	15	1550	74	2160	18	1836	59	2183	27	1791	72	2045	19	1933	76						
8	M/S GELE Solar Products India Pvt. Ltd for direct SSLS	27876	7011	3202	17599	64	16149	288	11145	294	10256	321	16986	313	4	0	27872	0						
9	M/S IIT Limited Direct SSLS	113879	21640	9085	80320	2834	58564	1178	50153	3985	32885	781	76128	4086	15873	635	93441	3931						
10	M/S Jai Auto Venices Pvt. Ltd	967	0	0	967	0	926	33	0	8	0	0	967	0	914	42	0	11						
11	M/S Kik Ventures Private Limited Direct SSLS	47425	31890	409	14770	356	30337	623	15968	498	34422	803	11800	401	27479	1086	18430	431						
12	M/S Lords Mark Industries Pvt. Ltd Direct SSLS	28362	1878	307	25550	627	21660	375	5647	681	2111	309	25469	474	20798	643	6504	420						
13	M/S Photonics Watertech Private Limited Direct SSLS	30240	1188	10	29015	27	1153	9	29047	31	1137	14	29059	30	1131	11	29060	38						
14	M/S Rajarshi Infra Projects Pvt. Ltd	956	624	46	252	34	629	42	251	34	625	44	252	35	624	48	251	33						
15	M/S San Energy And Solution for Direct SSLS	51028	34102	379	15732	815	35839	416	13743	1030	32651	477	16596	1304	33671	513	15217	1627						
16	M/S Shri Ram Sagar Construction for direct SSLS	44207	22332	334	20891	650	28512	476	14380	839	26850	654	15869	835	25366	662	17276	905						
17	M/S Solex Energy limited Direct SSLS	40104	0	0	40104	0	0	0	40104	0	0	0	40104	0	0	0	40104	0						
18	M/S Sri Savit for Direct SSLS	42597	21697	321	20111	468	29169	409	12523	496	19222	601	22323	451	29670	689	11503	735						
19	M/S Sugis Lloyd Ltd	1998	1636	33	208	121	1661	43	183	112	1674	44	195	87	1672	47	195	86						
20	M/S Sundigo Solar Solution Pvt.Ltd Direct SSLS	3916	916	29	2943	28	3052	54	748	62	1133	28	2705	50	1299	39	2512	66						
21	M/S Suryam International Pvt. Ltd	481	387	10	63	21	411	16	40	17	429	16	37	13	426	26	35	9						
22	M/S Syska LED Lights Pvt. Ltd	1845	1524	39	208	74	1526	50	210	78	1590	60	210	65	1616	49	200	67						
23	M/S Visual Technologies India Pvt. Ltd.	409	27	2	379	1	27	2	379	1	27	2	378	2	27	2	379	1						
Grand Total		535175	175333	16439	336534	6869	268627	4586	252638	9350	198761	4640	322562	9312	178129	4904	342604	9649						

112

अन्यादा
